

# Nieuwsbrief IN DE STEIGERS




Protestantse Gemeente  
Biddinghuizen

## Agenda:

April

overleg met:

- Aannemer
- Bouwcommissies 2.0
- Parochie
- Stichting MFG2

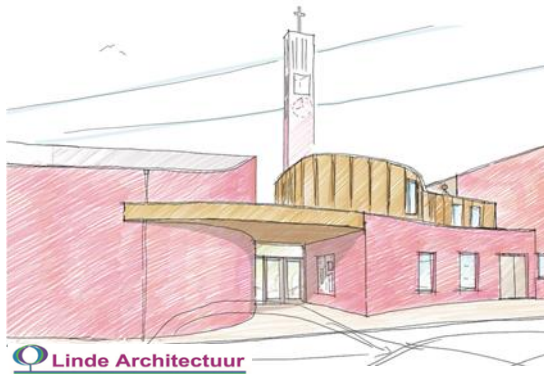

De verbouwing vordert gestaag. In deze 18<sup>e</sup> nieuwsbrief een update van de stand van zaken.

## Coronavirus

Ook met de bouw kunnen we er niet omheen: het coronavirus. De aannemer mag met een beperkt aantal mensen in onze kerk aan de slag zijn. Voorlopig gaat dit nog aardig goed en geeft de aannemer aan dat ze op planning liggen met de werkzaamheden. De opleverdatum van de aannemer is dus ongewijzigd: half mei.

## De bouw

Op 15 maart zouden we na afloop van de ochtenddienst in de nieuwe kerkzaal gaan kijken. Vanwege het coronavirus kon dat niet doorgaan. Om u toch een beeld te kunnen geven van de vorderingen volgt hieronder een aantal foto's.

Afgelopen week zijn de wanden gestuukt. Deze zijn nu aan het drogen. Op foto 1 en 2 ziet u de achterwand van het liturgisch centrum.



Foto 1



Foto 2

Er is ook hard gewerkt aan het stiltecentrum (foto 3) met daarboven de bergzolder (foto 4 en 5).

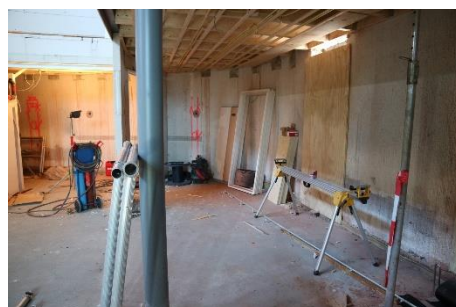


Foto 3



Foto 4



Foto 5

Er is een buffetvat (soort expansievat) t.b.v. de vloerverwarming geplaatst in de nis waar voorheen de schuifwanden in verdwenen. Uiteraard wordt dit nog netjes af/weggewerkt. Verder is er een warmtepomp onder de trap geïnstalleerd.



Foto 6



Foto 7

De consistorie ziet er als volgt uit (foto 8) en het aangezicht van de garderobe richting het stiltecentrum en ingang kleine kerkzaal ziet u op foto 9 en 10.



Foto 8

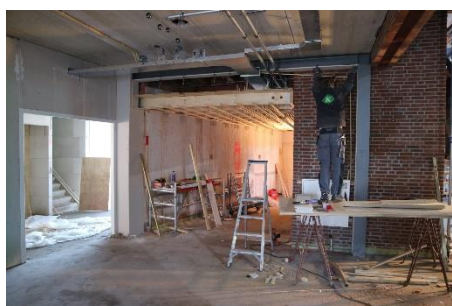


Foto 9



Foto 10

Aan de buitenzijde is de luifel bij de ingang geplaatst (foto 11). Op deze foto kunt u ook links van de luifel de kozijnen zien van het stiltecentrum.



Foto 11

## Planning

Zolang er geen strengere regelgeving komt omtrent corona blijft de planning als volgt:

Verbouwing nieuwe kerkzaal	T/m half mei 2020
Verhuizing	Mei/juni 2020
Inwijding nieuwe kerkzaal	Half juni 2020

## **Overige vorderingen in het verbouwproces**

In februari heeft u kunnen proefzitten op een aantal stoelen. Hieruit is de stoel met de kunststof kuip als beste uit de test naar voren gekomen; de Lynx III. Afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad het kleurenadvies van onze adviseur Daphne vd Knijff voor de stoelen besproken en hierop een akkoord gegeven. Er komen drie kleuruitvoeringen in de kerkzaal. Hiernaast is een voorbeeld weergegeven van de grijze kleuruitvoering.



## **Financieel bijdragen aan de verbouwing?**

We hebben voldoende middelen om de basisinvesteringen in ons nieuwe kerkgebouw te doen. Voor diverse opties wordt geprobeerd aanvullend geld te werven. Mocht u ook willen doneren? Dat kan via het bankrekeningnummer: NL88RABO0373740441 t.n.v. de Protestantse Gemeente Biddinghuizen o.v.v. bijdrage verbouwing. Via een periodieke gift kan dit een fiscaal voordeel voor u opleveren.

## **Vragen?**

Heeft u vragen of opmerkingen over MFG2 m.b.t. het kerkelijk gedeelte? Dan kunt u deze richten aan ondergetekende. Er is ook een speciaal emailadres hiervoor geopend: [mfg2@pgbiddinghuizen.nl](mailto:mfg2@pgbiddinghuizen.nl)

Namens de kerkenraad,

Claudia Boelens  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

## **Colofon:**

Contact: [mfg2@pgbiddinghuizen.nl](mailto:mfg2@pgbiddinghuizen.nl)

Uitgave: April 2020
